


# มาตรการเพิ่มความคล่องตัวในการจัดหาพัสดุ พ.ศ. 2561

1



แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อน พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 มีผลใช้  
บังคับ ตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ต่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 262 ลงวันที่ 18 ก.ค. 2560

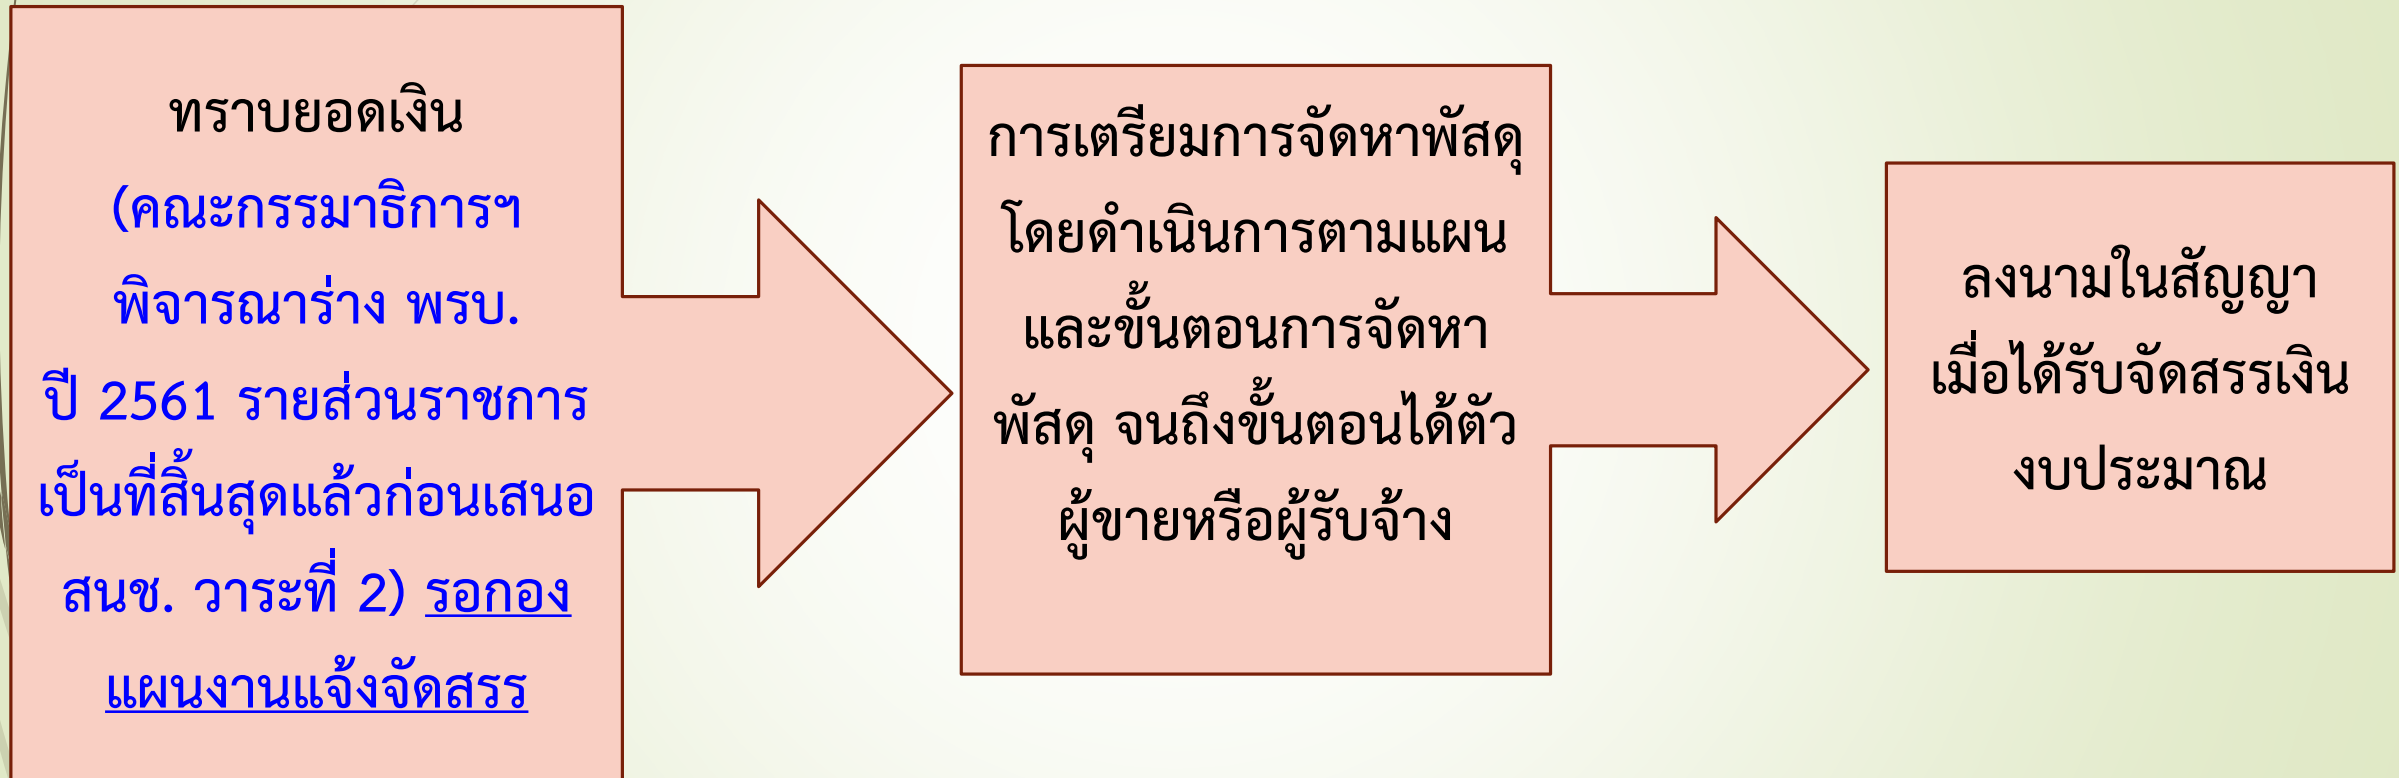

★ หมายเหตุ : ตามหนังสือกองคลัง ที่ สธ 0903.04/ว 5235 ลงวันที่ 12 ก.ค. 2560 ขอแก้ไขเรื่องการทราบยอดเงิน  
จากเดิม “วันที่ 31 ส.ค. 60” เป็น “นิตยตามหนังสือ ว. 262” ข้างต้น ★

รายการงบประมาณนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 231 รายการ  
วงเงินทั้งสิ้น 163,758,900.- บาท ณ วันที่ 31 ก.ค. 60  
(ค่าครุภัณฑ์ 181 รายการ และค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง 50 รายการ)

ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 181 รายการ  
วงเงิน 106,012,900.- บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 50 รายการ  
วงเงิน 57,746,000.- บาท

- ส่วนกลาง จำนวน 40 รายการ  
วงเงิน 31,339,800.- บาท
- ส่วนภูมิภาค จำนวน 141 รายการ  
วงเงิน 74,673,100.- บาท

- ส่วนกลาง จำนวน 9 รายการ  
วงเงิน 24,992,200.- บาท
- ส่วนภูมิภาค จำนวน 41 รายการ  
วงเงิน 32,753,800.- บาท

วิธีตกลงราคา (12 วันทำการ)  
วิธีสอบราคา (36 วันทำการ)  
วิธี e - bidding ( 61 วันทำการ)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามที่กองคลังกำหนด  
วิธีตกลงราคา (ไม่เกิน 12 วันทำการ) (วงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท)

★ การดำเนินการจัดหาตามขั้นตอนนี้จะต้องดำเนินการจนถึงขั้นตอนการอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งการบันทึกข้อมูลลงในระบบ e - GP ก่อนวันที่ 23 ส.ค. 60 มิฉะนั้นจะต้องดำเนินการตาม พรบ. ฉบับใหม่ ★

ค่าครุภัณฑ์

18 ก.ค. - 22 ส.ค. 60

1 - 7 ต.ค. 60 (เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ)

8 - 15 ต.ค. 60

16 - 24 ต.ค. 60

★ 1. จัดทำรายงาน  
ขอซื้อ/จ้าง

2. ออกใบสั่งซื้อ  
สั่งจ้าง/  
ทำสัญญา

3. ส่งมอบ  
พัสดุ/ตรวจรับ  
พัสดุ

4. เบิก  
จ่ายเงิน

ค่าที่ดินฯ

7 - 8 ส.ค. 60

1 - 7 ต.ค. 60 (เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ)

8 ต.ค. - 7 พ.ย. 60

8 - 16 พ.ย. 60


ขั้นตอนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามที่กองคลังกำหนด  
วิธีสอบราคา (ไม่เกิน 36 วันทำการ) (วงเงินเกิน 5 แสน แต่ไม่เกิน 2 ล้านบาท)

★ การดำเนินการจัดหาตามขั้นตอนนี้จะต้องดำเนินการจนถึงขั้นตอนการประกาศเอกสารเชิญชวน  
ในระบบ e - GP ก่อนวันที่ 23 ส.ค. 60 มิฉะนั้นจะต้องดำเนินการตาม พรบ. ฉบับใหม่ ★

ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินฯ

18 ก.ค. - 22 ส.ค. 60

23 - 29 ส.ค. 60

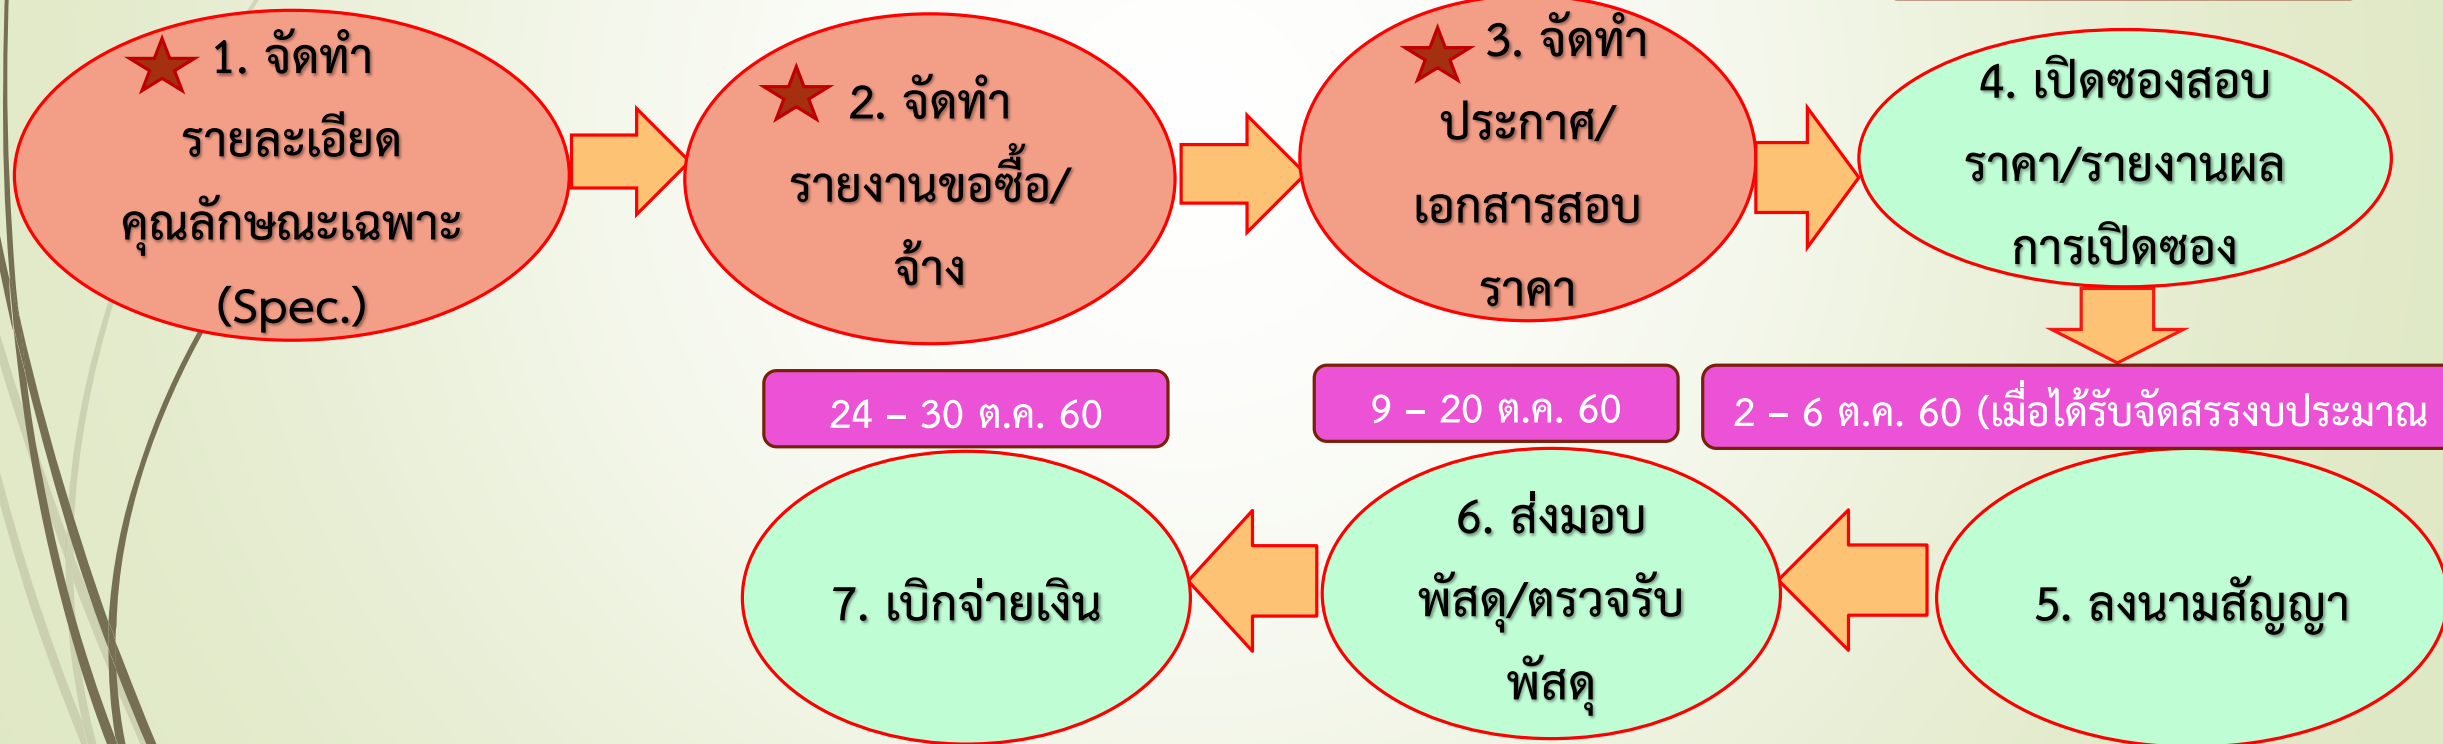

ขั้นตอนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามที่กองคลังกำหนด  
วิธี e - bidding (ไม่เกิน 61 วันทำการ) (วงเงินเกิน เกิน 2 ล้านบาท)

★ การดำเนินการจัดหาตามขั้นตอนนี้จะต้องดำเนินการจนถึงขั้นตอนการประกาศเอกสารเชิญชวน  
ในระบบ e - GP ก่อนวันที่ 23 ส.ค. 60 มิฉะนั้นจะต้องดำเนินการตาม พรบ. ฉบับใหม่ ★

ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินฯ

18 ก.ค. - 22 ส.ค. 60





รายการที่จัดทำ Spec. กลางร่วมกัน (11 หน่วยงาน) จำนวน 10 รายการ วงเงินทั้งสิ้น 20.41 ล้านบาท  
(กำหนดแล้วเสร็จภายใน 15 วันนับแต่วันที่รับทราบคำสั่งแต่งตั้งกรรมการ ฯ)

6

หน่วยงาน	รายการ	จำนวนหน่วย	วงเงินต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน
ศอ. ๑ (๑), ศอ. ๕ (๒) และ ศอ. ๑๐ (๑)	๑. ตู้อบเค้ก	๔ ตู้	๕๐๐,๐๐๐	๒,๒๐๐,๐๐๐
ศอ. ๑ (๒), ศอ. ๒ (๒), ศอ. ๓ (๕), ศอ. ๕ (๑๔) และ ศอ. ๑๒ (๓)	๒. ตู้วิงไฟฟ้า	๒๖ เครื่อง	๒๙๘,๔๐๐	๗,๗๕๘,๔๐๐
ศอ. ๑ (๑), ศอ. ๒ (๔) และ ศอ. ๓ (๓)	๓. จักรยานนั่งพิง	๘ เครื่อง	๑๒๐,๐๐๐	๙๖๐,๐๐๐
ศอ. ๑ (๒) และ ศอ. ๒ (๓)	๔. เครื่องเดินวงรี	๕ เครื่อง	๒๘๓,๐๐๐	๑,๔๑๕,๐๐๐
ศอ. ๑ (๒), ศอ. ๗ (๒) และ ศอ. ๑๒ (๘)	๕. เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์	๑๒ เครื่อง	๕๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐
ศอ. ๑ (๑), ศอ. ๕ (๒), ศอ. ๑๐ (๑) และ ศอ. ๑๒ (๓)	๖. เครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูก	๗ เครื่อง	๓๕๐,๐๐๐	๒,๔๕๐,๐๐๐
ศอ. ๒ (๑) และ ศอ. ๑๐ (๑)	๗. เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้า	๒ เครื่อง	๔๘๐,๐๐๐	๙๖๐,๐๐๐
ศอ. ๒ (๒), ศอ. ๓ (๒), ศอ. ๔ (๒) และ ศอ. ๗ (๑)	๘. เครื่องวัดความดันโลหิต	๗ เครื่อง	๗๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐
ศอ. ๒ (๒), ศอ. ๙ (๒) และ สสม. (๒)	๙. ชุดจำลองสถานการณ์	๖ ชุด	๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐
ศอ. ๔ (๑) และ ศอ. ๑๑ (๑)	๑๐. เครื่องวัดวิเคราะห์ห้องค์ประกอบ	๒ เครื่อง	๑,๕๕๐,๐๐๐	๓,๑๐๐,๐๐๐
	รวมทั้งสิ้น		๓,๘๓๑,๔๐๐	๒๐,๔๑๓,๔๐๐

★ ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอกรมฯ ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec. กลาง) ★

- หมายเหตุ :
1. กองคลังกำหนดวันที่จัดทำ Spec. กลาง และแจ้งคณะทำงานฯ ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อร่วมจัดทำ Spec. กลาง (ต้องให้สำเร็จภายใน 1 วัน)
  2. คณะทำงานฯ ต้องจัดเตรียมเอกสารรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec.) ของแต่ละรายการ พร้อมไฟล์สำหรับการจัดทำ Spec.
  3. คณะทำงานฯ ต้องจัดเตรียมคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) หน่วยงานละ 1 เครื่อง มาด้วย
